



COMPTE RENDU : COMITE DE RIVIERE DU BASSIN DE LA CEZE

Réunion du 16 mars 2020 en visioconférence

Ordre du jour :

- Élection du Vice-président du Comité de Rivière
- Contrat de Rivière : Bilan 2020
- Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) : Bilan 2020
- Contrat de Rivière : présentation de la méthodologie du bilan mi-parcours

Les membres du Comité de Rivière :

NOM	STRUCTURE	
Mme ESSEYRIC Catherine	Région Occitanie	Absente
	Région Auvergne-Rhône-Alpes	Absent
M. SERRE Christophe	Département du Gard	Absent
Mme CHAULET Cathy	Département du Gard	Absente
Mme BASTIDE Bérengère	Département de l'Ardèche	Absente
M. COURTES Francis	Département de la Lozère	Absent
M. TRICHOT Benoit	Syndicat Mixte ABCèze	Présent
M. VARIN D'AINVELLE Roch	Alès agglomération	Absent
M. HILLAIRE Bernard	Alès agglomération	Absent
M. SERRE Dominique	CC du Pays d'Uzès	Absent
M. DE FARIA Jean-Pierre	CC de Cèze-Cévennes	Absent
M. VIGOUROUX Claude	CC de Cèze-Cévennes	Absent
Mme GRAZIANO-BAYLE Monique	CA du Gard Rhodanien	Excusée
M. RIEU José	CA du Gard Rhodanien	Présent
M. BRUYERE-ISNARD Thierry	CC du Pays des Vans en Cévennes	Absent
M. MILESI Pascal	Syndicat Mixte du Pays des Cévennes	Absent
M. ASTIER Thierry	Syndicat Mixte du PETR Uzège-Pont du Gard	Absent
	Syndicat Mixte du SCOT de l'Ardèche Méridionale	Absent
M. BOUSQUET Bernard	Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Occitanie	Absent
M. GRAVIL Éric	Chambre d'agriculture du Gard	Absent
Mme CESENA Christel	Chambre d'agriculture de l'Ardèche	Absente
Mme VIDAL Nadia	Chambre d'agriculture de la Lozère	Absente
M. BRUNEL Grégory	Fédération des caves coopératives du Gard	Absent

M. GAUTIER Robert	Fédération de pêche du Gard	Absent
M. JAURE Brice	Agence de développement et de réservation touristique du Gard	Excusé
Mme CESPEDES Gaby	Fédération de l'Hôtellerie de plein air	Absente
M. LADOUBE	Fédération des Associations Cévenoles Environnement Nature	Présent
M. PIZON Jean-Loup	France Nature Environnement Languedoc-Roussillon	Absent
M. KÖNIG Bernard	Consommation Logement et Cadre de Vie	Excusé
M. DALAIN Jean-Marc	Confédération des Riverains du Rhône et de ses Affluents	Absent
M. BRISSON William	Comité départemental de canoë-kayak du Gard	Absent
M. LECAT Gabriel	DREAL Occitanie	Absent
M. CLOUSEAU Siegfried	Préfet du Gard – DDTM30	Absent
	Préfet de l'Ardèche – DDT 07	Absent
Mme GELY Anne	Préfet de la Lozère - DDT 48	Présente
M. RIVIERE Jean-Luc	Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée Corse	Présent
	Office français de la biodiversité	Absent
M. VEAUTE Jean-Michel	Agence régional de Santé	Présent
M. MANCHE Yannick	Parc National des Cévennes	Absent

Etaient également présents :

Mme JOLY Marie, CA du Gard Rhodanien
Mme UYUNI-REYES Violaine, Département du Gard
Mme BRAUD Cécile, SCOT Pays des Cévennes
Mme MARAIS Julie, Fédération de pêche du Gard
M. SOHIER Laury, Syndicat Mixte ABCèze
Mme CLAVEL Maud, Syndicat Mixte ABCèze
M. BRENTGANI Hugues, Syndicat Mixte ABCèze

Le diaporama de présentation de la réunion est joint en annexe 1.

Election du vice-président

Au vu du peu d'élus représentant les collectivités territoriales présents, M. TRICHOT propose de reporter cette élection.

→ **Les membres du Comité de rivière reporte l'élection du vice-président.**

Contrat de Rivière : Bilan 2020

Sur 121 opérations prévues, 46% sont réalisées ou en cours et 30% sont reportés sur 2021. 36% des montants prévus ont été engagés.

Syndicat d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze et petits affluents du Rhône

95 Chemin de la Carrière 30500 Saint-Ambroix - 04 66 25 32 22 - accueil@abceze.fr - www.abceze.fr
Établissement Public Territorial de Bassin



Les taux de réalisation des volets « qualité » et « ressource » sont particulièrement faibles avec des taux de report importants : 25% d'engagement et 44% de report pour le volet « qualité » et 38% d'engagement et 30% de report pour le volet « ressource ». Les volets « milieu » et « gestion » ont de meilleurs taux de réalisation, respectivement 66% et 82%.

Le taux élevé de report des actions sur l'année 2021 peut s'expliquer par plusieurs causes.

Cette année a été marquée par le retard de la mise en place des équipes municipales. Installés tardivement, les municipalités (et les intercommunalités) n'ont pas pu avancer sur les projets au cours du premier semestre.

D'autre part, 2020 est aussi la première année de prise des compétences « eau potable » et « assainissement » au sein des communautés d'agglomération (Alès Agglomération portait déjà la compétence assainissement). Cette année a donc été marquée par la mise en place des services en interne.

Enfin, l'Agence de l'Eau a lancé un appel à projets « Rebond », qui a facilité l'accès aux financements pour des projets jusqu'à présent non-éligibles. Les collectivités se sont donc mobilisées sur du renouvellement d'infrastructures moins prioritaires d'un point de vue environnemental. Ceci est particulièrement vrai pour les projets « eau potable » et « assainissement » des communautés d'agglomération.

Pour 2021, le contrat de rivière prévoit 104 opérations pour un montant de 12 274 050€.

→ **Remarques du Comité de Rivière**

Suite à la question de Mme MARAIS, M. SOHIER précise que les travaux de franchissement du seuil de Chusclan tiennent les délais avec des travaux prévus cet été.

Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) : Bilan 2020

La saison d'étiage estivale 2020 a été correcte sur la Cèze puisqu'aucune restriction n'a été mise en place par le Préfet. Néanmoins les affluents ont été plus touchés et en particulier l'Auzonnet qui a connu des débits très bas.

Sur l'avancement du PGRE, l'objectif de réduction de prélèvements à horizon 2027 est de 820 000 m³. Sur la période 2010-2020, 397 500 m³ ont été économisés. En ce qui concerne la période du Contrat, 112 000 m³ ont d'ores-et-déjà été économisés pour un objectif d'économie de 242 523 m³ à horizon 2024.

→ **Remarques du Comité de Rivière**

- Opération « Economies d'eau » et sensibilisation des habitants

M. TRICHOT informe le Comité de Rivière que le Syndicat ABCèze vient de lancer une opération de sensibilisation des habitants à la préservation de la ressource et aux économies d'eau.

M. SOHIER précise que l'Agence de l'Eau n'a pas retenu le financement des cuves de récupération d'eau de pluie dans la demande de subvention qui lui a été adressée (contrairement à d'autres bassins versants qui ont pu en bénéficier).

C'est donc le Syndicat Mixte ABCèze qui finance la réduction du prix pour les habitants.

M. RIVIERE confirme que ses cuves ne sont pas éligibles dans le cadre de l'appel à projet « Economies d'eau ». Elles pourraient être éligibles lors d'un prochain appel à projets axé sur la prévention du ruissellement. Le financement de ce type de projet pourrait aussi être étudié dans le cadre d'une opération dans la seconde phase du Contrat de Rivière.

En réponse à Mme BRAUD, M. BRENTGANI répond que l'appel à manifestations à destination des communes sur les diagnostics de consommation d'eau des bâtiments et sites publics se fera à l'automne 2020.

- Concertation

Mme UYUNI-REYES informe le Comité que le Département du Gard va poursuivre sa concertation avec les acteurs locaux sur l'adaptation au changement climatique. Des ateliers sont planifiés en novembre.

Mme JOLY informe également que la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien est en cours d'élaboration de son plan climat et qu'une ambition forte sur la gestion de l'eau est prévue dans la stratégie territoriale. Des ateliers de concertation auront lieu entre mi-avril et mi-mai, dont un sur la thématique « eau ». L'objectif est de valider ce plan climat fin 2021.

M. SOHIER précise que le Syndicat va travailler à un dispositif de concertation sur le changement climatique en complément de celui du département du Gard. Il pense qu'il serait bien que les différentes structures se coordonnent sur ses différentes phases de concertation.

- Eaux souterraines

M. VEAUTE rappelle que les eaux issues des nappes alluviales sont en général d'excellente qualité et beaucoup plus facilement protégeables que les eaux karstiques. Ces dernières nécessitent un système de filtration onéreux pour rendre l'eau potable. Il voudrait savoir ce qu'il en est des financements sur ce sujet.

M. RIVIERE répond que, du côté de l'Agence de l'Eau, les subventions sont liées à l'objectif de gain environnemental. Donc si une action de substitution par une ressource karstique permet d'enlever un prélèvement en ressource déficitaire, le traitement peut être pris en compte dans la subvention.

M. LABOUDE soulève le problème de la qualité des eaux du karst liée aux traitements faits en surface.

M. RIVIERE répond qu'en général les eaux karstiques sont moins touchées par les pollutions diffuses (nitrate, pesticides) en comparaison de celles des cours d'eau. Ceci peut s'expliquer par l'occupation du sol sur les zones karstiques qui est moins favorable à l'agriculture intensive et à la migration des eaux dans le sol.

M. BRENTGANI prend l'exemple du karst de l'Urgonien sur le bassin de la Cèze. Les premiers éléments, issus de l'étude sur les eaux souterraines menée



actuellement par le Syndicat, montrent une absence de pollution par les pesticides, mais une dégradation de la qualité microbiologique de l'eau.

M. SOHIER informe le Comité de Rivière qu'un travail d'amélioration du suivi des PGRE va être fait avec l'Agence de l'Eau, mais aussi avec tous les acteurs concernés par le PGRE.

M. RIVIERE appuie sur la nécessité de travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs sur ce point.

Contrat de Rivière : Bilan mi-parcours

Le Contrat de Rivière court sur la période 2019-2024. En 2021, il est prévu de mettre à jour la programmation de phase 2 (2022-2024). Lors de cette mise à jour, les opérations prioritaires des nouveaux territoires de compétence du Syndicat ABCèze (Nizon, Galet, Malaven et Arnave) seront incluses dans le Contrat.

L'objectif est de valider ce bilan et la programmation de 2nde phase en Comité de Rivière en décembre pour un passage devant la commission des aides de l'Agence de l'Eau en mars 2022.

Une phase de rencontre des maitres d'ouvrages aura lieu entre avril et juin.

Pour ce qui est de la convention financière, Mme CLAVEL se rapprochera des signataires de la convention initiale pour savoir s'ils veulent signer cette nouvelle convention.

→ Remarques du Comité de Rivière

M. RIVIERE précise qu'un avis de la MISEN (mission inter-services de l'eau et de la nature), qui rassemble l'ensemble des services de l'Etat, sera nécessaire.

Il précise également qu'un nouveau SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) est actuellement en concertation pour mise en application en 2022. Il faudra tenir compte de ses éléments.

Rappel des acronymes

PGRE : Plan de gestion de la ressource en eau

CA : communauté d'agglomération

CC : communauté de communes

DREAL : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

DDT/DDTM : Direction départementales des territoires/et de la mer

SCOT : schéma de cohérence territoriale

MISEN : mission inter-services de l'eau et de la nature

SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

ANNEXE 1

DIAPORAMA DE PRESENTATION



Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze

Comite de Rivière du bassin de la Cèze

Visioconférence,
le 16 mars 2021



Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze

Election du Vice-Président du Comité de Rivière



Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze



Contrat de rivière du bassin de la Cèze - Bilan 2020

CORIV du 16 mars 2021

Le Contrat 2019-2024



Montant total :
59 277 899 €



443
opérations



78 maîtres
d'ouvrage

Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver



- ▶ Obtenir un bon fonctionnement des systèmes d'assainissement.
- ▶ Réduire les pollutions diffuses, en particulier sur les captages prioritaires.
- ▶ Sécuriser les usages (eau potable et baignade).

Gérer durablement les ressources en eau



- ▶ Améliorer la connaissance de l'hydrologie et des prélèvements.
- ▶ Favoriser la solidarité entre les usagers.
- ▶ Economiser l'eau.
- ▶ Accompagner les usagers.

Renforcer la gestion concertée et durable



- ▶ Animer et mettre en œuvre le Contrat de Rivière.
- ▶ Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'eau.
- ▶ Envisager l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
- ▶ Renforcer la cohérence entre politique de l'eau et choix d'urbanisme.

Préserver et restaurer les milieux aquatiques




- ▶ Améliorer le fonctionnement de la Cèze et de ses affluents.
- ▶ Sauvegarder la biodiversité et les zones humides.
- ▶ Réhabiliter et maintenir le bon état des milieux aquatiques.

Le bilan 2020

→ Prévisionnel : 121 opérations pour un montant de 11 159 367€

- **46%** des opérations en cours ou réalisées
- **30%** reportées à 2021
- **36%** des montants engagés

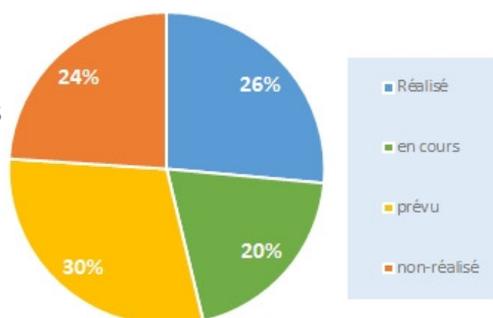

Le bilan 2020

Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver (QUA)

- **36** opérations prévues → **25%** réalisées ou en cours / **44%** reportées à 2021
- **2 645 463€** engagé soit **42%** du prévisionnel

Actions importantes

№	Opération	Maître d'ouvrage	P	Montant prévu	Avancement
QUA1.1	Réalisation du SDA intercommunal (stratégie intercommunal)	CA du Gard Rhodanien	1	500 000	Prévu en 2021
QUA1.6	CONCOULES - Réhabilitation de la station	Alès Agglomération	2	586 000	En attente pour Alès Agglo
QUA1.7	SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET - Mise en séparatif de la traversée de Saint-Florent		1	350 000	Prévu en 2021
QUA1.7	LE MARTINET - Mise en séparatif des antennes secondaires du réseau du Martinet		1	100 000	Prévu en 2021
QUA1.9	SAINT-AMBROIX - Mise en séparatif des réseaux	Saint-Ambroix	1	441 000	Réflexion sur la mise à jour de leur programmation en cours
QUA1.10	LUSSAN - Réhabilitation du système d'Audabiac	Lussan	2	230 000	Prévu en 2021
QUA1.11	ST-LAURENT-LA-VERNEDE - Construction d'une nouvelle step	SIAEPA St-Laurent-la-V	1	515 000	En cours
QUA1.11	LAUDUN - Création d'une nouvelle step pour Laudun-village	CA du Gard Rhodanien	1	2 200 000	En cours
QUA1.11	LAUDUN - Réhabilitation de réseau	CA du Gard Rhodanien	1	295 200	En cours
QUA3.3	Champ captant du Clavelet - Etudes de BAC	CA du Gard Rhodanien	1	50 000	Captage déclassé

Le bilan 2020

Préserver et restaurer les milieux aquatiques (MIL)

- **29** opérations prévues → **66%** réalisées ou en cours / **24%** prévues en 2021
- **438 649€** engagé soit **38%** du prévisionnel

Actions importantes

° FA	Opération	Maître d'ouvrage	P	Montant prévu	Avancement
MIL1.2	Acquisition pour accompagner les ajustements morphologiques à Bagnols/Cèze (Aubagnac)	SMABCèze	1	20 000	en cours
MIL1.3	Restauration morphologique de la Tave, secteur de Tresques - Travaux	SMABCèze	1	350 000	Prévu en 2021
MIL1.4	Restauration Nizon - Acquisitions foncières et MO	SMABCèze	1	174 500	En cours
MIL1.5	Franchissement du seuil de Chusclan - MO	SMABCèze	1	72 000	En cours
MIL2.1	Gestion de la zone humide des Imbres - Travaux de restauration	SMABCèze	1	20 000	Prévu en 2021

Le bilan 2020

Gérer durablement les ressources en eau (RES)

- **40** opérations prévues → **38%** réalisée ou en cours / **30%** prévues en 2021
- **509 891€** engagé soit **16%** du prévisionnel

Actions importantes

° FA	Opération	Maître d'ouvrage	P	Montant prévu	Avancement
RES1.1	Fiabilisation des stations de mesures de débits à Rivières	SPC Grand Delta (DREAL)	1	25 000	Non-réalisé
RES1.3	Pré-diagnostic des eaux souterraines de tout le bassin Cèze	SMABCèze	1	60 000	En cours
RES2.1	Réalisation d'un nouveau SDAEP SIAEP de Courry Gagnières	SIAEP de Courry Gagnières	1	100 000	Non-réalisé
RES2.1	Réalisation d'un nouveau SDAEP Ex-Syndicat du Luech		1	300 000	Non-réalisé
RES2.1	Réalisation d'un nouveau SDAEP le Martinet	Alès Agglomération	1	130 000	Non-réalisé
RES2.1	Réalisation d'un nouveau SDAEP St-Florent-sur-A		1	60 000	Prévu en 2021
RES2.1	Réalisation d'un SDAEP (stratégie intercommunale)	CA du Gard Rhodanien	1	500 000	Prévu en 2021
RES2.4	LE MARTINET - Réhabilitation de réseau		1	100 000	Prévu en 2021
RES2.4	ST-FLORENT-SUR-A - Réhabilitation de réseau suite à SDAEP	Alès Agglomération	1	305 000	Prévu en 2021
RES2.10	Diagnostic du réseau de l'ASA de Saint-Jean		1	40 000	
RES2.11	Création d'une retenue collinaire pour substituer une partie du prélèvement de l'ASA de Saint-Jean - Etudes	ASA d'irrigation de Saint-Jean-de-Maruéjols	1	100 000	Prévu en 2021?
RES5.2	Poste OUGC	OUGC	1	55 000	OUGC dissous

Le bilan 2020

Renforcer la gestion concertée et durable (GES)

- **16** opérations prévues → **82%** réalisée ou en cours
- **419 586€** engagé soit **105%** du prévisionnel


Actions importantes

° LA	Opération	Maître d'ouvrage	P	Montant prévu	Avancement
GES2.2	Outils de communication	SMABCèze	1	10 000	En cours
GES4.1	Réunion annuelle SMABCèze/SCOT	SMABCèze/ SCOT	1	En interne	Non-réalisé

Le bilan 2019-2020

→ Prévisionnel : 166 opérations pour un montant de 26 382 024€

- **57%** des opérations en cours ou réalisées
- **24%** reportées à 2021
- **45%** des montants engagés

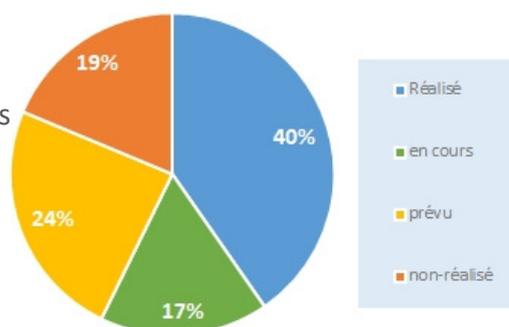

Prévisionnel 2021

Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver (QUA)

- **27** opérations prévues – **2 875 450€**

Actions importantes:

Prévu 2021	Report 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation SDA Bessèges • Réhabilitation de réseau à Pont-de-Rastel - Génolhac • Raccordement à Saint-Ambroix des stations Molières et Meyrannes • Réhabilitation de réseaux à Molières-sur-Cèze 	<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation du SDA intercommunal sur CA du Gard Rhodanien • Mise en séparatif de réseaux à St-Florent-sur-A et Le Martinet • Réhabilitation station Audabiac à Lussan

Prévisionnel 2021

Préserver et restaurer les milieux aquatiques (MIL)

- **26** opérations prévues – **2 010 000€**

Actions importantes:

Prévu 2021	Report 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Restauration du Nizon – Travaux • Franchissement du seuil de Chusclan – Travaux • Labellisation rivières sauvages de la Gourdouze et du Rieutort 	<ul style="list-style-type: none"> • Restauration morphologique sur la Tave - Travaux • Gestion de la zone humide des Imbres - Travaux

Prévisionnel 2021

Gérer durablement les ressources en eau (RES)

- **34** opérations prévues – **6 911 600€**
- Actions importantes:

Prévu 2021	Report 2020
<ul style="list-style-type: none"> • 7 SDAEP (dont Bessèges) • Réhabilitation de réseau (dont Alès Agglo, SIVOM Cèze-Auzonnet) • Substitution des forages aep de la moyenne vallée – Travaux • Diagnostic du réseau de l'ASA d'irrigation de l'Aven de Cal • Révision du règlement d'eau du barrage de Sénéchas 	<ul style="list-style-type: none"> • SDAEP à l'échelle de l'Agglo du Gard Rhodanien • SDAEP de St-Florent-sur-A. • Réhabilitation de réseaux aep Le Martinet et St-Florent-sur-A. • Diagnostic de réseau de l'ASA d'irrigation de St-Jean • Etude pour la création d'une retenue pour l'ASA d'irrigation de St-Jean

Prévisionnel 2021

Renforcer la gestion concertée et durable (GES)

- **17** opérations prévues – **477 000€**

Actions importantes:

Prévu 2021	Report 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Postes techniques du Syndicat • Programme de sensibilisation « Et au milieu coule la Cèze » • Bilan mi-parcours du Contrat • Mise à jour de l'étude d'opportunité d'élaboration d'un SAGE 	



Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze

Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE)- Bilan 2020

CORIV du 16 mars 2021


Plan de séance

- 1/ Retour saison 2020
- 2/ Actions PGRE 2020
- 3/ Prévisionnel 2021



1/ Retour saison 2020


POURCENTAGE de la NORMALE du CUMUL de PRECIPITATIONS (en mm) ETE 2020 (à partir des stations de mesures)

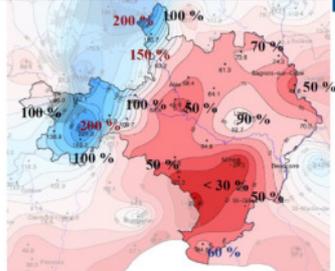


- 2020 : Vigilance pour la Cèze (Gard) et **Alerte** pour les communes ardéchoises
- 2019 : **Crise Cèze aval**, **Alerte renforcée Cèze amont**, **Alerte renforcée communes ardéchoises**
- 2018 : **Alerte renforcée communes ardéchoises**
- 2017 : **Crise Cèze amont et aval**, **Alerte renforcée communes ardéchoises**

Débit bas puis épisode du 12 juin 2020 : 200 mm en amont

Problèmes sur l'Auzonnet :
- Débit bas depuis 2 ans (20 à 30 l/s)
-DDTM info communes

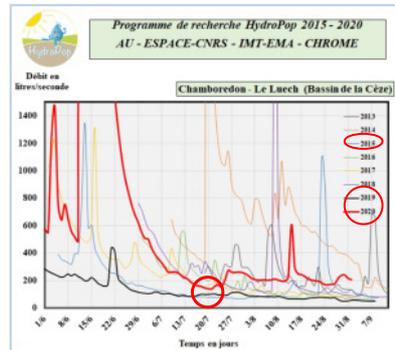

2/ Actions PGRE 2020

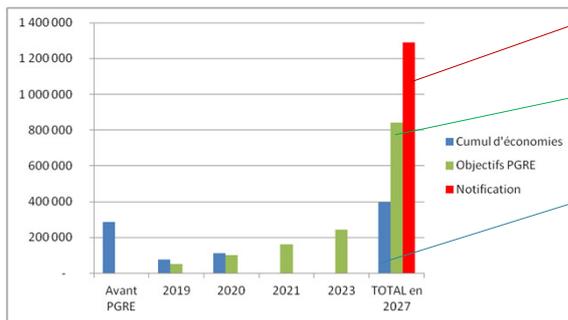

Objectifs notification préfectorale : 1.29 millions de m³

Objectifs PGRE : 2027 = 820 000 m³

Economies PGRE 2010-2020 : 397 500


Economies avant PGRE (2010 à 2017) = 285 500 m³

Economies en 2019 = 76 000 m³
Economies en 2020 = 36 000 m³
= 112 000 m³

Objectifs 2019-20 = 100 000 m³

2/ Actions PGRE 2020

70 %
réalisé ou
en cours

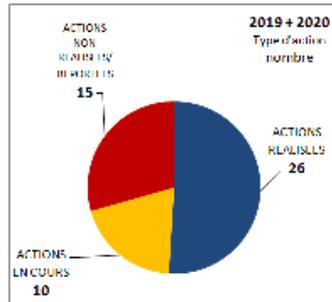

Actions abandonnées :

- OUGC Cèze amont
- SDAEP Bordezac, Peyremale

Reports:

- SDAEP
- Actions Alès Agglomération

Réalisées :


- SIVOM Cèze Auzonnet
- GIE de Salindres

Sous BV	Volumes mois en déficit 2019 + 2020	Objectifs PGRE 2023
Moyenne Cèze	75000	72 491
Luech	33000	36 432
Cèze amont	2600	37 134
Tave	1400	26 784
Ganière	Pas quantifiable	18 556
Auzonnet	Pas quantifiable	49 860
Cèze aval	Pas quantifiable	0
TOTAL	112 000	242 523

2/ Actions PGRE 2020

Exemples d'actions

Etude Ressource Stratégique

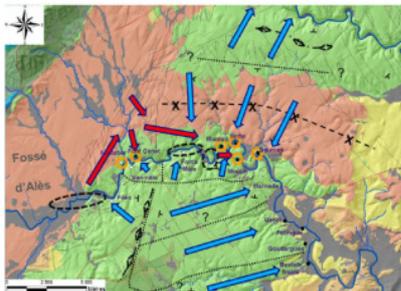

Phase 1 :

- COPIL lancement et COTEC
- Besoins en eau
- Diagnostic ressource



Suivi des débits

- 5 stations
- 26 sites jaugés
- 58 jaugeages

Journée entre EPTB
et CD 30

Animation Stockage – station SDAGE



Sondes apports d'eau




3/ Prévisionnel 2021

Actions autres MO

SDAEP Gard Rhodanien

8 autres SDAEP



Besoin en eau des cultures (sondes)

Etude **stockage ASA** de Saint-Jean
et diag réseau
600 000m³

Substitution AEP Moyenne vallée
par Clairac



Substitution GIE Salindres

Travail sur le **règlement
d'eau du barrage de
Sénéchas** : 600 l/s ?



Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze

Bilan mi-parcours

Le contenu

1. Rappel du Contrat et de sa stratégie

2. Bilan de la première phase

Bilan technique et financier: global et priorités

Bilan de l'engagement des partenaires financiers / Syndicat Mixte ABCèze

3. Avancement de la programmation

Intégration des nouveaux territoires de compétence du Syndicat ?

Connaissance supplémentaire (nouvelles non-conformités, nouveau PDM?)

Difficultés rencontrées et moyens mis en œuvre pour y remédier

4. Actualisation de la seconde phase

Présentation des chiffres de la 2^{nde} phase révisée

5. Fiches-action révisées

Planning

→ Objectif: présentation à la commission des aides de AERMC en mars 2022

	Mars	Avr	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Prog Ph2	CORIV	Rencontre MO (env. 30) Rédac FA			Financeurs AEP-Asst		Financeurs - autres		CORIV	Envoi convention à AE
					Validation MO		Validation MO			
Bilan							Rédaction	COTEC		
Convention								réduction		
